



Ville du Grand-Saconnex

Conseil municipal du lundi 15 septembre 2014





CAD – SIG

Chauffage à distance

Suivi des travaux





Ville du Grand-Saconnex


Sommaire

- **Planning des travaux du 28 août 2013**
- **Planning des travaux du 2 juin 2014**
- **Carrefour Sonnex – Pommier**
- **Carrefour Moïse-Duboule - Fins**





Planning des travaux du 28 août 2013

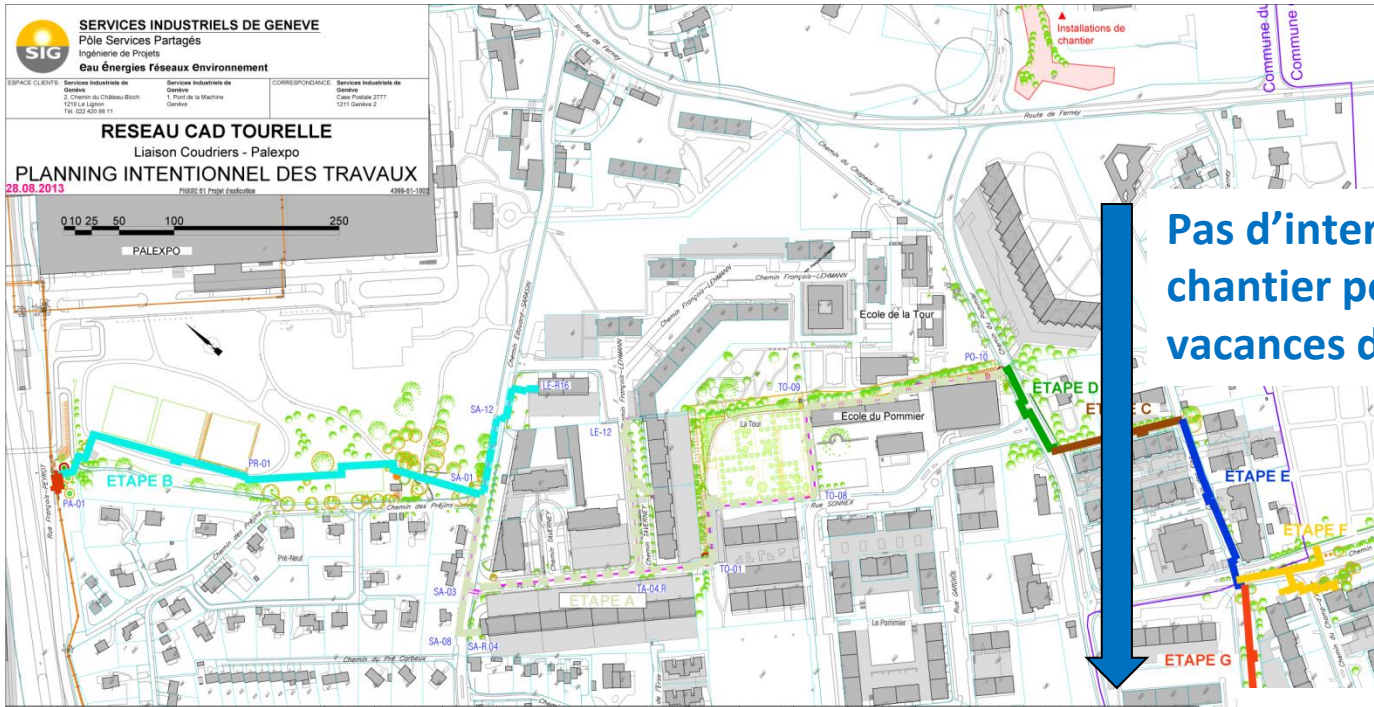

Pas d'interruption du chantier pour les vacances de l'entreprise

ETAPE	PHASE	TRONCONS	LONGUEURS	DUREE SEMAINES	MOIS												
					juil.13	août.13	sept.13	oct.13	nov.13	déc.13	janv.14	févr.14	mars.14	avr.14	mai.14	juin.14	juil.14
A	PHASE 8 ECOLE DU POMMIER	TO-PO	152ml		VACANCES SCOLAIRES												
	Chambre Pommier	TO-TO	226ml		NOEL												
	PHASE 1 PARC LA TOUR	TA-TO	230ml														
	PHASE 2 CH. TAVERNEY	TA-TO	230ml														
	PHASE 3 ANT. TAVERNEY	Ant.LE 12m	174ml														
	PHASE 4 CH. SARASIN + ANT.	SA-TA	195ml														
	PHASE 5 PARC SARASIN 1ère	PR-SA	240ml														
	PHASE 6 PARC SARASIN 2ème	PR-SA	206ml	12													
B	Chambre François-PEYROT		11														
	PHASE 7 SARASIN ANT. LEHMANN	Ant.LE 20m	135ml	10													
	FINITIONS		2														
C	PHASE 10 CH. DES FINS 1ère	FI-FI	130ml	11													
D	PHASE 10 CH. DES FINS 2ème	PO-FI	110ml	2+19													
E	PHASE 1A CH. DES FINS 2ème	FI-MO	180ml	14													
F	PHASE 15 CHAMPS D'ANIER	ant-CA	140ml	8													
G	PHASE 11 COUDRIERS	MO-CO	145ml	8													

Fin travaux annoncés pour le 29 août 2014





Planning des travaux du 2 juin 2014



SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Pôle Services Partagés
Ingénierie de Projets
Eau Énergies Réseaux Environnement

SPACE CLIENT: Services Industriels de Genève
2, Chemin du Château Blech
1218 La Lognonne
Tél. 022 450 88 11


CORRESPONDANCE: Services Industriels de Genève
Case Postale 277
1211 Epalinges 2

RESEAU CAD TOURELLE

Liaison Coudriers - Palexpo

PLANNING INTENTIONNEL DES TRAVAUX 2.06.2014

0 10 25 50 100 250
PALEXPO

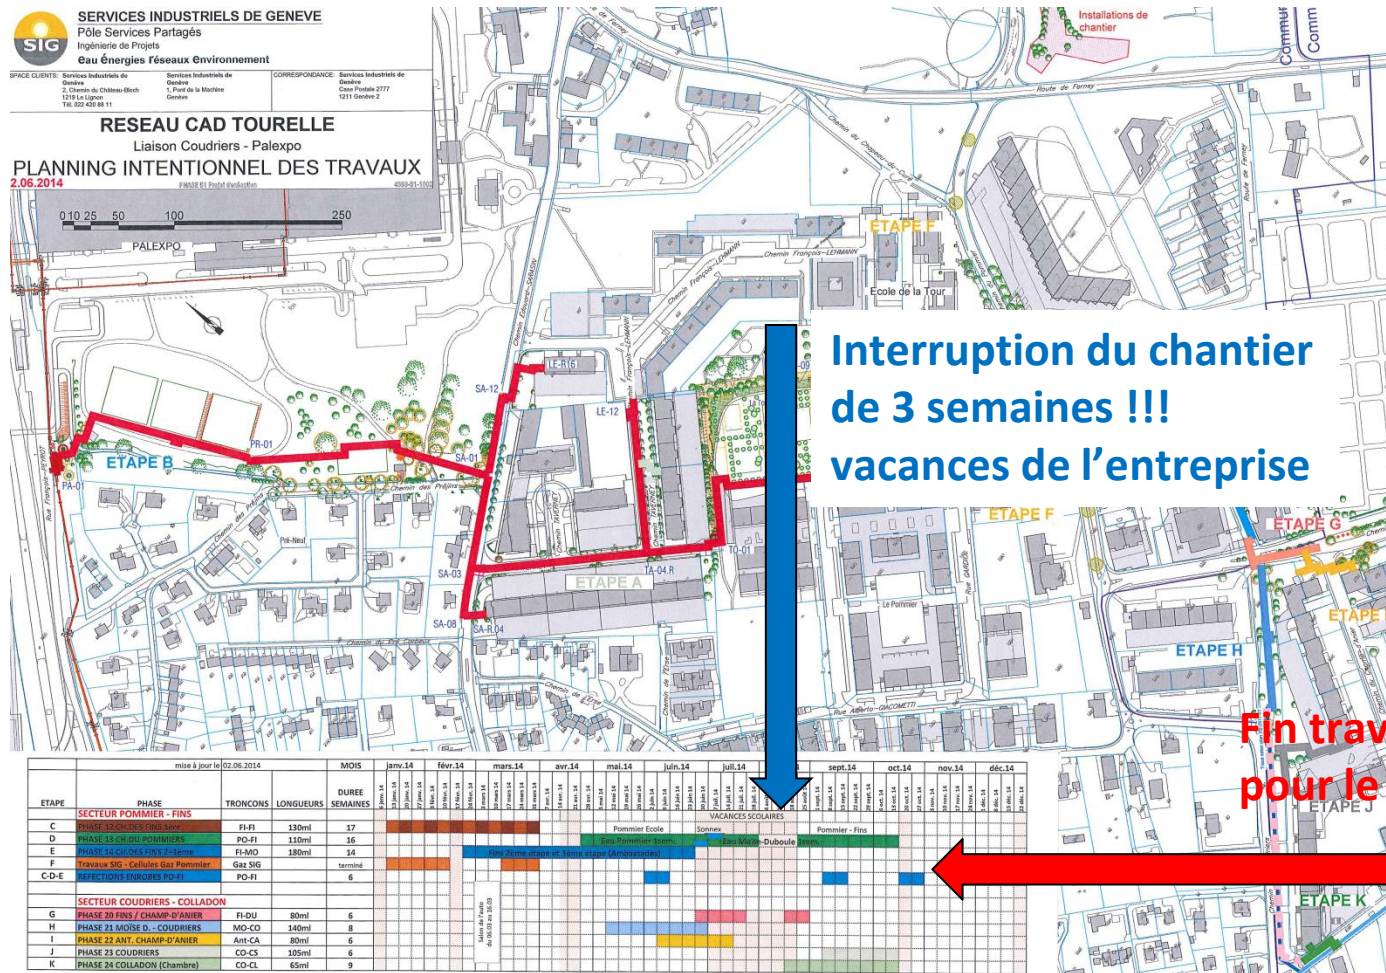

Interruption du chantier
de 3 semaines !!!
vacances de l'entreprise

Fin travaux annoncés
pour le 31 octobre 2014

mise à jour le 02.06.2014				MOIS																							
				janv.14		févr.14		mars.14		avr.14		mai.14		juin.14		juil.14		sept.14		oct.14		nov.14		déc.14			
ETAPE	PHASE	TRONCONS	LONGUEURS	SEMAINES																							
SECTEUR POMMIER - FINS																											
C	PHASE 12 CU 355 FINS 3500	FI-FI	130ml	[Gantt bars for C]																							
D	PHASE 15 CU 000 POMMIERES	PO-FI	110ml	[Gantt bars for D]																							
E	PHASE 16 CU 000 POMMIERES	FI-BO	180ml	[Gantt bars for E]																							
F	Travaux SIG - Cellules Gas Pommiere	Gas SIG	terminal	[Gantt bars for F]																							
C-D-E	REFLECTIONS BORDURES POI	PO-FI	6	[Gantt bars for C-D-E]																							
SECTEUR COUDRIERS - COLLADON																											
G	PHASE 20 FINS / CHAMP-D'ANIER	FI-DU	80ml	[Gantt bars for G]																							
H	PHASE 21 MOISE D. - COUDRIERS	MO-CO	140ml	[Gantt bars for H]																							
I	PHASE 22 ANT. CHAMP-D'ANIER	Ant-CA	80ml	[Gantt bars for I]																							
J	PHASE 23 COUDRIERS	CO-CS	105ml	[Gantt bars for J]																							
K	PHASE 24 COLLADON (Chambre)	CO-CL	65ml	[Gantt bars for K]																							



Carrefour Sonnex - Pommier

- 29 et 30 septembre rabotage enrobé bitumineux
- 1er et 2 octobre pose de l'enrobé bitumineux définitif
- 3 octobre marquage provisoire
- 6 au 9 octobre réfection îlot et marquage définitif
- **10 octobre travaux terminés => carrefour rendu !**





Ville du Grand-Saconnex

Carrefour Duboule - Fins

- **26 septembre travaux terminés => carrefour rendu !**





Ville du Grand-Saconnex

Merci pour votre attention

